

DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Analyse des risques et matrice des risques

Identification, évaluation, traitement et suivi

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

Élément	Valeur
Référence	AMB-CONC-03
Version	1.0
Date	Octobre 2026
Porteur du projet	Rachid Bonsa
Statut	Version validé
Diffusion	Confidentiel

Sommaire

1. Introduction et démarche
2. Échelles d'évaluation
3. Identification des risques
4. Analyse et évaluation
5. Matrice des risques
6. Plan de traitement
7. Risques résiduels
8. Suivi et gouvernance des risques
9. Conséquences pour la conception
10. Synthèse

1. Introduction et démarche

1.1 Objet du document

Ce document est le troisième livrable du dossier de conception d'Ambawbio Suite. Il identifie les événements incertains qui pourraient empêcher le projet d'atteindre ses objectifs, mesure leur gravité et définit les mesures pour les maîtriser. Il s'appuie sur l'étude des parties prenantes (AMB-CONC-01) et sur l'étude fonctionnelle (AMB-CONC-02), et complète les sept risques déjà évoqués dans la proposition de projet.

1.2 Démarche

La démarche suit les étapes classiques de la gestion des risques, inspirées de la norme ISO 31000 :

1. **Identifier** les risques par catégorie : réglementaire, juridique, technique, sécurité, partenaires, marché, financier, organisation, opérationnel, environnement.
2. **Analyser** chaque risque : cause, conséquence, probabilité et impact.
3. **Évaluer** la criticité (probabilité × impact) et positionner le risque dans la matrice.
4. **Traiter** : choisir une réponse (éviter, réduire, transférer, accepter) et des mesures concrètes, avec un propriétaire et un indicateur d'alerte.
5. **Surveiller** : réévaluer les risques à chaque comité de pilotage.

2. Échelles d'évaluation

2.1 Probabilité

Note	Niveau	Signification
1	Rare	Ne devrait pas se produire pendant la durée du projet (moins de 10 %).
2	Peu probable	Pourrait se produire (10 à 30 %).
3	Possible	A autant de chances de se produire que non (30 à 50 %).
4	Probable	Se produira vraisemblablement (50 à 80 %).
5	Quasi certain	Se produira presque sûrement (plus de 80 %).

2.2 Impact

Note	Niveau	Délai	Coût	Conformité et réputation
1	Négligeable	Moins d'une semaine	Moins de 1 % du budget	Aucun effet visible
2	Mineur	1 à 2 semaines	1 à 3 %	Insatisfaction ponctuelle
3	Modéré	2 semaines à 1 mois	3 à 10 %	Plaintes de clients, image dégradée
4	Majeur	1 à 3 mois	10 à 20 %	Non-conformité corrigable, perte de clients
5	Critique	Plus de 3 mois	Plus de 20 %	Interdiction de vente, sanction, arrêt du projet

2.3 Criticité et niveau de risque

La criticité est le produit de la probabilité par l'impact. Elle varie de 1 à 25 et détermine le niveau du risque et la conduite à tenir.

Criticité	Niveau	Conduite à tenir
15 à 25	Critique	Traitement immédiat, suivi à chaque comité, mesures obligatoires avant le jalon suivant.
10 à 14	Élevé	Plan d'action formalisé avec un propriétaire et une échéance.
5 à 9	Moyen	Mesures de réduction si leur coût est raisonnable ; surveillance régulière.
1 à 4	Faible	Risque accepté ; surveillance simple.

3. Identification des risques

L'analyse a identifié **29 risques** répartis en 10 catégories.

Catégorie	Nombre	Risques
Réglementaire	4	R01 Spécifications FEC indisponibles ou tardives R02 Refus de la certification différée hors-ligne R03 Évolution des barèmes fiscaux et sociaux R04 Non-conformité à la loi sur les données personnelles
Juridique	2	R05 Absence de structure juridique R06 Protection de la marque et du logiciel
Technique	5	R07 Complexité de la synchronisation hors-ligne R08 Perte de données locales non synchronisées R09 Dérive du périmètre fonctionnel R10 Performances insuffisantes sur terminaux modestes R11 Dette technique du monolithe
Sécurité	3	R12 Fuite de données entre entreprises R13 Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) R14 Fraude interne en caisse
Partenaires	3	R15 Accès tardif aux API Mobile Money R16 Dépendance à un agrégateur unique R17 Fiabilité de l'hébergement local
Marché	3	R18 Faible adoption par les entreprises R19 Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux R20 Prix inadapté au pouvoir d'achat
Financier	2	R21 Financement insuffisant R22 Coûts récurrents sous-estimés
Organisation	3	R23 Dépendance au porteur du projet R24 Difficulté à recruter et à retenir des développeurs R25 Expertise métier insuffisante
Opérationnel	2	R26 Capacité de support insuffisante R27 Migration de données de mauvaise qualité
Environnement	2	R28 Contexte sécuritaire et accès au terrain R29 Coupures d'électricité et de réseau chez les clients

4. Analyse et évaluation

Le tableau ci-dessous détaille la cause, la conséquence et l'évaluation brute de chaque risque, c'est-à-dire avant toute mesure de traitement. P = probabilité, I = impact, C = criticité.

ID	Risque	Cause	Conséquence	P	I	C
R01	Spécifications FEC indisponibles ou tardives	Aucun contact à la DGI ; documentation technique de la FEC (format, API, procédure d'agrément des logiciels) non publique ou évolutive	Module de facturation non conforme ; impossibilité de vendre aux entreprises du régime normal	4	5	20
R02	Refus de la certification différée hors-ligne	La DGI peut exiger une certification en temps réel de chaque facture	Le différenciateur hors-ligne est limité pour la facturation certifiée	3	5	15
R03	Évolution des barèmes fiscaux et sociaux	Lois de finances annuelles, réformes de l'IUTS, de la CNSS ou de la TVA	Calculs erronés, redressements pour les clients, perte de confiance	4	4	16
R04	Non-conformité à la loi sur les données personnelles	Formalités CIL non accomplies, consentement absent, transferts hors du pays	Sanctions de la CIL, perte de crédibilité auprès des administrations	3	4	12
R05	Absence de structure juridique	Projet porté en nom propre	Impossible de signer avec un agrégateur, un hébergeur, un investisseur ou une administration ; responsabilité personnelle illimitée	4	4	16
R06	Protection de la marque et du logiciel	Nom « Ambawbio » et code source non protégés	Usurpation du nom, copie du produit	2	3	6
R07	Complexité de la synchronisation hors-ligne	Conflits de données, opérations concurrentes, longues périodes sans réseau	Stocks faux, doublons, perte de confiance, retards de développement	4	5	20
R08	Perte de données locales non synchronisées	Le navigateur peut effacer le stockage local ; vol, panne ou réinitialisation du terminal	Ventes et encaissements perdus	3	5	15
R09	Dérive du périmètre fonctionnel	Ambition de parité avec Odoo (156 fonctionnalités)	MVP jamais terminé, épuisement du budget	4	5	20
R10	Performances insuffisantes sur terminaux modestes	Application Angular lourde, PC anciens, téléphones d'entrée de gamme	Rejet par les caissiers, abandon	3	4	12
R11	Dette technique du monolithe	Couplage entre modules au fil des ajouts	Évolutions lentes et risquées	3	3	9
R12	Fuite de données entre entreprises	Défaut d'isolation multi-tenant	Atteinte grave à la confidentialité, fin de la confiance	2	5	10
R13	Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude)	Plateforme financière exposée sur Internet	Indisponibilité, vol de données, fraude aux paiements	3	5	15
R14	Fraude interne en caisse	Annulations, remises ou retours abusifs	Pertes pour les clients, mise en cause du logiciel	3	3	9
R15	Accès tardif aux API Mobile Money	Aucun contact ; contractualisation longue avec les agrégateurs ou opérateurs	Paielements réels indisponibles au lancement	4	4	16
R16	Dépendance à un agrégateur unique	Un seul fournisseur de paiement	Hausse des commissions, panne ou arrêt de service	2	4	8
R17	Fiabilité de l'hébergement local	Coupures d'électricité, connectivité internationale, capacité limitée des hébergeurs	Indisponibilité du SaaS au-delà de l'objectif de 99,5 %	3	4	12
R18	Faible adoption par les entreprises	Habitudes (Excel, cahier, WhatsApp), méfiance envers le numérique, peur du contrôle fiscal	Revenus insuffisants	3	5	15

ID	Risque	Cause	Conséquence	P	I	C
R19	Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux	Intégrateurs d'Odoo ou éditeurs de caisse qui adaptent leur offre à la FEC	Perte de l'avantage du premier entrant	4	3	12
R20	Prix inadapté au pouvoir d'achat	Coûts d'hébergement, de support et de développement élevés	Abonnements trop chers pour les petites structures ou trop bas pour être rentables	3	4	12
R21	Financement insuffisant	Projet personnel sans levée de fonds à ce stade	Arrêt du développement avant le MVP	4	5	20
R22	Coûts récurrents sous-estimés	Hébergement, SMS, commissions de paiement, support	Marge négative	3	3	9
R23	Dépendance au porteur du projet	Une seule personne porte la vision, l'architecture et les relations	Blocage en cas d'indisponibilité	4	4	16
R24	Difficulté à recruter et à retenir des développeurs	Rareté des profils Java/Spring et Angular expérimentés ; concurrence des salaires	Retards, qualité insuffisante	3	4	12
R25	Expertise métier insuffisante	Règles SYSCOHADA, fiscales et de paie complexes	Erreurs de calcul, non-conformité	3	5	15
R26	Capacité de support insuffisante	Croissance du nombre de clients, besoin d'accompagnement de proximité	Insatisfaction, résiliations	3	3	9
R27	Migration de données de mauvaise qualité	Données clients dispersées (Excel, cahiers)	Démarrage difficile, erreurs de stock et de soldes	4	3	12
R28	Contexte sécuritaire et accès au terrain	Déplacements restreints dans certaines régions	Pilotes et support limités hors des grandes villes	3	3	9
R29	Coupures d'électricité et de réseau chez les clients	Instabilité des réseaux électriques et mobiles	Interruption de l'activité si le logiciel en dépend	5	3	15

5. Matrice des risques

La matrice positionne chaque risque selon sa probabilité et son impact. Les numéros correspondent aux identifiants (par exemple 07 pour R07). La matrice de gauche montre les risques bruts ; celle de droite, les risques résiduels une fois les mesures appliquées.

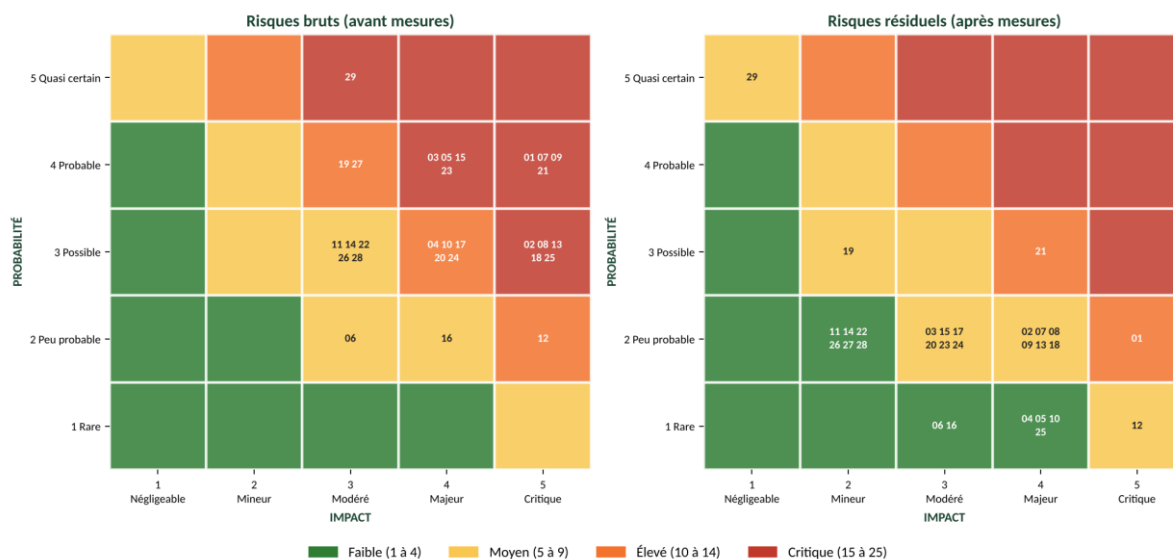


Figure 1 : Matrices des risques bruts et résiduels

Niveau	Risques bruts	Risques résiduels
Critique	14	0
Élevé	8	2
Moyen	7	15
Faible	0	12

5.1 Les risques prioritaires

Les risques critiques (criticité de 15 ou plus) concentrent l'attention. Ils touchent les trois promesses du projet (conformité, hors-ligne, Mobile Money) ainsi que sa viabilité.

Rang	ID	Risque	Criticité
1	R01	Spécifications FEC indisponibles ou tardives	20
2	R07	Complexité de la synchronisation hors-ligne	20
3	R09	Dérive du périmètre fonctionnel	20
4	R21	Financement insuffisant	20
5	R03	Évolution des barèmes fiscaux et sociaux	16
6	R05	Absence de structure juridique	16
7	R15	Accès tardif aux API Mobile Money	16
8	R23	Dépendance au porteur du projet	16
9	R02	Refus de la certification différée hors-ligne	15

Rang	ID	Risque	Criticité
10	R08	Perte de données locales non synchronisées	15
11	R13	Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude)	15
12	R18	Faible adoption par les entreprises	15
13	R25	Expertise métier insuffisante	15
14	R29	Coupures d'électricité et de réseau chez les clients	15

6. Plan de traitement

Quatre réponses sont possibles : **éviter** (supprimer la cause), **réduire** (diminuer la probabilité ou l'impact), **transférer** (à un assureur ou un partenaire) ou **accepter** (en connaissance de cause).

ID	Risque	Réponse	Mesures	Propriétaire	Indicateur d'alerte
R01	Spécifications FEC indisponibles ou tardives	Réduire	Démarche officielle auprès de la DGI dès la Phase 0 (courrier, rendez-vous via la CCI-BF) ; module de conformité isolé et paramétrable ; veille sur les textes publiés	Porteur du projet	Spécifications non obtenues au mois 3
R02	Refus de la certification différée hors-ligne	Réduire	Valider tôt avec la DGI le traitement des factures émises hors-ligne ; prévoir un ticket provisoire puis une FEC à la reconnexion ; option de certification via réseau mobile de secours	Porteur du projet	Position écrite de la DGI
R03	Évolution des barèmes fiscaux et sociaux	Réduire	Barèmes versionnés par date d'effet (RG-10), paramétrables sans redéploiement ; veille réglementaire avec l'expert-comptable ; tests automatisés à chaque changement	Expert métier	Publication de la loi de finances
R04	Non-conformité à la loi sur les données personnelles	Éviter	Formalités auprès de la CIL avant le pilote ; protection des données dès la conception (EX-08) ; hébergement au Burkina Faso ; registre des traitements	Porteur du projet	Formalités non déposées au mois 9
R05	Absence de structure juridique	Éviter	Créer la société éditrice avant la signature des premiers contrats (Phase 0 ou début de Phase 1) ; contrats types (CGU, CGV, accord de traitement des données)	Porteur du projet	Premier contrat à signer
R06	Protection de la marque et du logiciel	Réduire	Dépôt de la marque auprès de l'OAPI ; clauses de propriété intellectuelle dans les contrats des développeurs ; dépôt du code source	Porteur du projet	Dépôt non effectué avant le lancement
R07	Complexité de la synchronisation hors-ligne	Réduire	Moteur de synchronisation développé en premier ; journal d'opérations idempotent ; règles de conflit par type (RG-05, RG-06) ; tests de terrain en conditions réelles	Responsable technique	Taux de synchronisation réussie inférieur à 99 %
R08	Perte de données locales non synchronisées	Réduire	Demande de stockage persistant ; application Android empaquetée avec base chiffrée ; synchronisation dès qu'un réseau existe ; alerte visible sur les opérations non synchronisées	Responsable technique	Opérations non synchronisées depuis plus de 24 h
R09	Dérive du périmètre fonctionnel	Réduire	Respect strict de la matrice MoSCoW ; toute nouvelle demande passe par un arbitrage ; livraisons par releases ; MVP limité aux 57 Must	Porteur du projet	Plus de 10 % de fonctionnalités ajoutées hors plan
R10	Performances insuffisantes sur terminaux modestes	Réduire	Budget de performance (ENF-03) ; chargement différé des modules ; tests sur un parc de terminaux bas de gamme	Responsable technique	Temps d'ajout d'article supérieur à 300 ms
R11	Dette technique du monolithe	Réduire	Monolithe modulaire avec frontières de modules vérifiées automatiquement ; revues de code ; tests	Responsable technique	Violations de dépendances entre modules
R12	Fuite de données entre entreprises	Éviter	Filtrage systématique par entreprise au niveau de l'accès aux données et de la base (sécurité au niveau des lignes) ; tests automatisés d'isolation (ENF-06)	Responsable technique	Tout test d'isolation en échec
R13	Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude)	Réduire	MFA, chiffrement, journal d'audit, sauvegardes hors ligne 3-2-1, tests d'intrusion avant le lancement, supervision	Responsable sécurité	Alertes de supervision, vulnérabilités critiques ouvertes
R14	Fraude interne en caisse	Réduire	Droits fins, validation des écarts (RG-09), journal d'audit inaltérable, rapports d'anomalies	Responsable produit	Taux d'annulations anormal

ID	Risque	Réponse	Mesures	Propriétaire	Indicateur d'alerte
R15	Accès tardif aux API Mobile Money	Réduire	Simulateur de paiement dès le MVP (F-PAY-04) ; couche d'abstraction ; démarches auprès de plusieurs agrégateurs en parallèle dès la création de la société	Porteur du projet	Aucun contrat signé au mois 12
R16	Dépendance à un agrégateur unique	Réduire	Couche d'abstraction des opérateurs (F-PAY-06) ; deuxième connecteur prévu ; mode de secours manuel	Responsable technique	Indisponibilité de l'agrégateur
R17	Fiabilité de l'hébergement local	Réduire	Hébergeur avec alimentation de secours ; site de secours géographiquement séparé ; le hors-ligne limite l'impact pour les utilisateurs	Responsable infrastructure	Disponibilité mensuelle inférieure à 99,5 %
R18	Faible adoption par les entreprises	Réduire	Offre d'entrée simple (caisse + facture certifiée) ; argument de conformité FEC obligatoire ; entreprises pilotes de référence ; accompagnement de proximité	Porteur du projet	Taux de conversion des pilotes inférieur à 50 %
R19	Concurrence d'Odo localisé et des éditeurs locaux	Réduire	Mettre en avant le hors-ligne, le Mobile Money natif et le prix en FCFA ; aller vite sur le MVP ; partenariats avec les cabinets comptables	Porteur du projet	Lancement d'offres concurrentes conformes FEC
R20	Prix inadapté au pouvoir d'achat	Réduire	Tests de prix pendant la Phase 0 ; packs modulaires ; tarification par utilisateur et par module	Porteur du projet	Taux de refus pour cause de prix
R21	Financement insuffisant	Réduire	Financement par tranches liées aux jalons ; MVP réduit ; revenus précoces avec l'offre d'entrée ; recherche de subventions, d'incubateurs et de prix	Porteur du projet	Trésorerie inférieure à 3 mois de dépenses
R22	Coûts récurrents sous-estimés	Réduire	Modèle de coûts par client ; refacturation des SMS ; suivi mensuel des coûts	Porteur du projet	Coût par client supérieur à 40 % de l'abonnement
R23	Dépendance au porteur du projet	Réduire	Documentation complète (ce dossier) ; constitution d'une équipe et d'un comité ; partage des accès critiques	Porteur du projet	Décisions bloquées plus d'une semaine
R24	Difficulté à recruter et à retenir des développeurs	Réduire	Stack standard et documentée ; partenariats avec écoles et centres de formation ; stages ; intéressement au capital	Porteur du projet	Poste vacant depuis plus de 2 mois
R25	Expertise métier insuffisante	Réduire	Convention avec un expert-comptable et un juriste ; jeux de tests validés par eux ; couverture de tests de 100 % des règles	Expert métier	Écart sur un jeu de test de référence
R26	Capacité de support insuffisante	Réduire	Base de connaissances, formations, réseau d'intégrateurs partenaires, centre d'assistance	Responsable succès client	Délai de réponse moyen supérieur à 24 h
R27	Migration de données de mauvaise qualité	Réduire	Assistant d'import avec contrôles (F-SOC-16) ; modèles de fichiers ; accompagnement à la reprise	Responsable succès client	Taux de rejet à l'import
R28	Contexte sécuritaire et accès au terrain	Réduire	Pilotes concentrés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; support et formation à distance ; partenaires locaux	Porteur du projet	Annulation de missions terrain
R29	Coupures d'électricité et de réseau chez les clients	Accepter et réduire	Fonctionnement hors-ligne (ENF-01), sauvegardes locales, interface économe en énergie	Responsable technique	Signalements d'interruption

7. Risques résiduels

Le risque résiduel est celui qui subsiste une fois les mesures appliquées. Il doit être accepté explicitement par le porteur du projet.

Lecture

Après traitement, aucun risque ne reste critique. R01 (« Spécifications FEC indisponibles ou tardives ») et R21 (« Financement insuffisant ») restent à un niveau élevé : ils exigent un suivi rapproché à chaque comité de pilotage. R29 (coupures chez les clients) reste quasi certain, mais son impact devient négligeable grâce au hors-ligne : c'est la meilleure illustration de la valeur de ce différenciateur.

ID	Risque	Brut	Niveau brut	Résiduel	Niveau résiduel
R01	Spécifications FEC indisponibles ou tardives	20	Critique	10	Élevé
R02	Refus de la certification différée hors-ligne	15	Critique	8	Moyen
R03	Évolution des barèmes fiscaux et sociaux	16	Critique	6	Moyen
R04	Non-conformité à la loi sur les données personnelles	12	Élevé	4	Faible
R05	Absence de structure juridique	16	Critique	4	Faible
R06	Protection de la marque et du logiciel	6	Moyen	3	Faible
R07	Complexité de la synchronisation hors-ligne	20	Critique	8	Moyen
R08	Perte de données locales non synchronisées	15	Critique	8	Moyen
R09	Dérive du périmètre fonctionnel	20	Critique	8	Moyen
R10	Performances insuffisantes sur terminaux modestes	12	Élevé	4	Faible
R11	Dette technique du monolithe	9	Moyen	4	Faible
R12	Fuite de données entre entreprises	10	Élevé	5	Moyen
R13	Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude)	15	Critique	8	Moyen
R14	Fraude interne en caisse	9	Moyen	4	Faible
R15	Accès tardif aux API Mobile Money	16	Critique	6	Moyen
R16	Dépendance à un agrégateur unique	8	Moyen	3	Faible
R17	Fiabilité de l'hébergement local	12	Élevé	6	Moyen
R18	Faible adoption par les entreprises	15	Critique	8	Moyen
R19	Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux	12	Élevé	6	Moyen
R20	Prix inadapté au pouvoir d'achat	12	Élevé	6	Moyen
R21	Financement insuffisant	20	Critique	12	Élevé
R22	Coûts récurrents sous-estimés	9	Moyen	4	Faible
R23	Dépendance au porteur du projet	16	Critique	6	Moyen
R24	Difficulté à recruter et à retenir des développeurs	12	Élevé	6	Moyen
R25	Expertise métier insuffisante	15	Critique	4	Faible
R26	Capacité de support insuffisante	9	Moyen	4	Faible
R27	Migration de données de mauvaise qualité	12	Élevé	4	Faible
R28	Contexte sécuritaire et accès au terrain	9	Moyen	4	Faible

ID	Risque	Brut	Niveau brut	Résiduel	Niveau résiduel
R29	Coupures d'électricité et de réseau chez les clients	15	Critique	5	Moyen

8. Suivi et gouvernance des risques

- **Registre vivant** : ce document constitue la version initiale du registre des risques. Il est mis à jour à chaque comité de pilotage mensuel.
- **Propriétaires** : chaque risque a un propriétaire chargé de suivre son indicateur d'alerte et d'appliquer les mesures.
- **Escalade** : un indicateur d'alerte déclenché sur un risque critique ou élevé est remonté au porteur du projet sous 48 heures.
- **Revue aux jalons** : une réévaluation complète a lieu à la fin de chaque phase (cadrage, MVP, pilote, lancement).
- **Nouveaux risques** : tout membre de l'équipe peut proposer un nouveau risque, qui est évalué au comité suivant.

Moment	Activité	Participants
Chaque semaine	Point sur les risques techniques (R07 à R14) en réunion d'équipe	Équipe de développement
Chaque mois	Revue du registre, des indicateurs et des mesures	Comité de pilotage
Fin de phase	Réévaluation complète et mise à jour de la matrice	Porteur, comité, experts
Avant le lancement	Audit de sécurité et de conformité	Porteur, prestataire externe

9. Conséquences pour la conception

Plusieurs mesures de traitement deviennent des choix de conception. Elles seront reprises dans l'étude d'architecture (livrable n°4).

Risques	Choix de conception retenu	Livrable concerné
R01, R02, R03	Module de conformité fiscale isolé, avec des règles et des barèmes paramétrables et versionnés.	Architecture, classes
R07, R08	Moteur de synchronisation conçu en premier ; journal d'opérations idempotent ; base locale persistante et chiffrée ; application Android empaquetée.	Architecture, séquences
R09, R11	Monolithe modulaire aux frontières vérifiées automatiquement ; livraisons par releases selon la matrice MoSCoW.	Architecture
R10	Chargement différé des modules Angular ; budget de performance contrôlé.	Architecture
R12	Isolation multi-tenant au niveau applicatif et au niveau de PostgreSQL (sécurité au niveau des lignes).	Architecture, classes
R13, R14	MFA, journal d'audit chaîné, rôles fins, chiffrement.	Architecture, classes
R15, R16	Interface unique de paiement avec plusieurs implémentations : simulateur, agrégateur, opérateurs.	Architecture, classes, séquences
R27	Assistant d'import avec validation et rapport d'erreurs.	Cas d'utilisation

10. Synthèse

Le projet présente un profil de risque élevé mais maîtrisable. Sur 29 risques, 14 sont critiques avant traitement et aucun ne l'est après. Les risques majeurs ne sont pas techniques au sens strict : ils tiennent à l'accès aux institutions (DGI, agrégateurs de paiement), au financement et à la structuration juridique du projet. Ils se traitent principalement pendant la Phase 0.

10.1 Actions prioritaires de la Phase 0

1. Créer la société éditrice (R05) et déposer la marque Ambawbio auprès de l'OAPI (R06).
2. Engager la démarche auprès de la DGI pour obtenir les spécifications de la FEC et valider le traitement hors-ligne (R01, R02).
3. Signer une convention avec un cabinet d'expertise comptable (R03, R25).
4. Contacter plusieurs agrégateurs de paiement agréés (R15).
5. Construire le plan de financement par jalons (R21).
